Cierre de los sprints

Reporte del Corte 2 | Scrum y XP | DataForge Consulting para FinBank

Resultado de la entrega. El incremento prepara datos de mora y está integrado en main mediante el PR #8. La ejecución reproduce 5.000 registros sintéticos, un reporte de calidad, un diccionario de 18 variables y etiquetas a 30 y 60 días. Las 16 pruebas pasan.

El caso conserva 12 semanas y COP 180 millones. Daniel Martínez mantiene liderazgo y reporte; Rafael Baracaldo actúa como Product Owner y Oscar Merino como Scrum Master. Los tres desarrollan. La entrega cubre preparación de datos; el modelo se abordará en S3.

Sprint y objetivo	Compromiso	Cierre	Resultado del caso
S1: gobierno, acceso y perfilamiento	16 pts	16 pts	100 %; cuatro ítems cerrados
S2: base de mora y churn	20 pts	15 pts	75 %; T-05.5 conserva 5 pts

15,5
Puntos por sprint
(16 + 15) / 2

+25 %
Compromiso de S2
20 / 16 - 1

5 pts
Trabajo pendiente
Historial de churn

En C1 establecimos Charter, presupuesto, riesgos y tablero. En C2 profundizamos los eventos Scrum y añadimos pruebas, coautoría y revisión por PR. La capacidad observada orienta el siguiente compromiso y la calidad se comprueba al ejecutar el incremento.

Sprint 1: 16 a 0

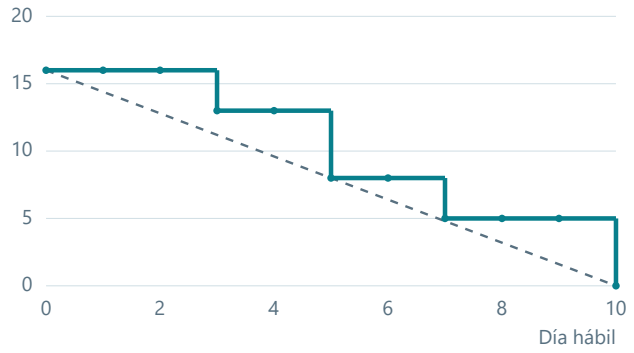

Sprint 2: 20 a 5

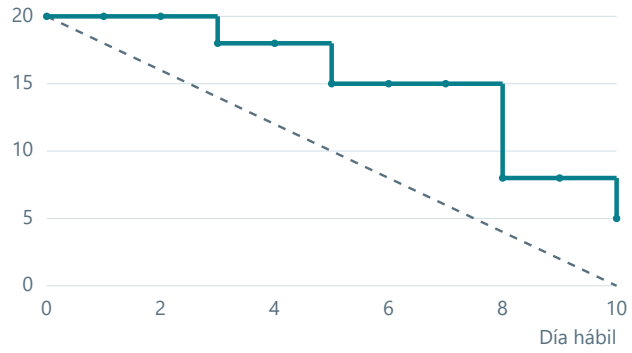

Curvas del escenario académico, reconstruidas al cierre de cada día a partir de la bitácora. Línea continua: puntos pendientes; discontinua: ideal. S2 descuenta 2 pts en D3, 3 en D5, 7 en D8 y 3 en D10. Fuente y serie: docs/SPRINT_METRICS.md y docs/evidence/sprint_burndown.csv.

Bitácora y retrospectivas

Gestión del escenario académico | Días relativos de los Sprints 1 y 2

Los Dailies previstos duran quince minutos. Esta selección recoge cambios del plan. Las fechas de GitHub documentan la implementación y revisión técnica de octubre; los registros originales de reuniones quedan sujetos a acreditación ante el docente.

Día	Hecho	Siguiente paso	Impedimento o decisión
S1 D1	Planning: 16 puntos	Charter, tablero y muestra	Solicitar acceso y apoyo
S1 D3	Tablero y DoD listos	Perfilar y tramitar acuerdo	Acceso a bodega pendiente
S1 D5	Perfilamiento cerrado	Revisar Charter	Centralizar el script
S1 D7	Charter aprobado en el caso	Atender protección de datos	Acuerdo a la espera de firma
S1 D10	Acuerdo cerrado; 16 pts	Review y Planning S2	Adoptar repo y CI
S2 D1	Planning: 20 puntos	Preparar mora; pedir churn	Dependencia externa abierta
S2 D3	Muestra y layout listos	Pairing P1; probar reglas	Revisar nulos y datos personales
S2 D5	Reglas cerradas	Calidad y refactor R-01	Eliminar límites duplicados
S2 D6	Calidad en revisión	Intentar extracto churn	Credencial pendiente
S2 D7	SM escala el bloqueo	Pairing P2; adelantar targets	Reordenar con el PO
S2 D8	Calidad y targets cerrados	Revisar diccionario	Churn permanece bloqueado
S2 D10	Diccionario listo; 15 pts	Review y retrospectiva	Devolver 5 pts al backlog

Actas de retrospectiva

Sprint	Empezar	Dejar de hacer	Continuar
S1	Centralizar scripts y probar reglas	Aceptar trabajo aislado	Usar muestra de apoyo
S2	Verificar dependencias y capacidad	Comprometer tareas bloqueadas	Rotar parejas y revisar cambios

Seguimiento: Oscar tiene repo y CI operativos; Rafael conserva P1/P2 en la bitácora; Daniel concilió las curvas con los cierres del caso. Para Planning S3, Oscar verificará dependencias y Rafael priorizará con Developers. Durante la Review, Daniel y Rafael registrarán aceptación y observaciones. Detalle: docs/DAILY_RETROSPECTIVES.md.

Prácticas XP y evidencia

Incremento reproducible | Validación, calidad, diccionario y etiquetas de mora

16 / 16
Pruebas que pasan
8 validación, 4 calidad, 4 targets

22 a 18
Variables conservadas
Umbral inclusivo de 80 %

5.000
Registros sintéticos
4.681 observaciones disponibles

Práctica	Aplicación	Evidencia vigente
Pairing	P1: Rafael conduce y Daniel revisa reglas. P2: Oscar conduce y Rafael revisa targets. Se documentan decisiones y cambio de conductor.	Coautoría en 211d6c3 y b3bb92e; dos sesiones descritas en XP_LOG.
TDD	Las pruebas cubren rangos, tipos, faltantes y etiquetas. La ausencia de loan_amount expone el fallo antes del refactor.	c90a325: 1 falla y 11 pasan. d9d2b52: 12 pasan. Suite completa: 16 pasan.
CI y propiedad colectiva	Los componentes pasan por ramas y aprobación de pares. El PR #8 consolida #2 a #7 en main.	PR #1 a #8 aprobados e integrados. Main protegida y CI exitoso para 0b53f59.
Diseño simple y refactor	Validación y diccionario consultan los límites de schema.py. Una función recorre las 22 variables.	Antes: 99 líneas y cinco variables. Después: 84 y 22. Versiones y pruebas conservadas.

Resultados que podemos reproducir

Cuatro variables quedan por debajo del 80 % de completitud: canal digital 54,7 %, educación 65,3 %, dependientes 72,1 % y vivienda 60,9 %. El diccionario conserva las otras 18 con descripción, valores y dueño de negocio. La demo rechaza un score de 1200 y una columna cedula.

Las etiquetas presentan tasas de 5,85 % a 30 días y 2,37 % a 60 días sobre 4.681 observados. Las 319 cuentas con observación faltante conservan NaN. Estos resultados corresponden a la muestra sintética generada con semilla 2026.

La cuenta OscarSantiagoMerino abrió #1 a #7; correoalejandro abrió #8. Daniel aprobó #1 y #8; Rafael aprobó #2 a #7; Oscar también aprobó #8. XP_LOG detalla aportes y revisiones. Código: src/finbank/. Registros: docs/evidence/. CI de main: actions/runs/38844935088.

Preparación de la Review

Estado técnico y decisiones del siguiente sprint | Actualización del 16 de octubre de 2026

El PR #8 quedó integrado el 15 de octubre a las 22:19, hora de Colombia. La entrega técnica cuenta con revisión y pruebas reproducibles. La Sprint Review completará la aceptación del incremento frente a los criterios del cliente.

Condición de cierre	Evidencia y estado
Ejecución y pruebas	Pipeline y 16 pruebas verificados; resultados en docs/evidence.
Revisión e integración	Ocho PR integrados; aprobación del conjunto por Oscar y Daniel en #8.
Validación de contenido	Rafael aprobó muestra, reglas, calidad y diccionario en los PR.
Aceptación del incremento	Registro por criterios preparado para completar con PO y docente.
Demostración	Guion de 900 s: incluye 150 s de demo y 60 s de preguntas; evento pendiente.

Propuesta para Sprint 3

Trabajo	Condición y decisión
US-06: mora, 13 pts	Definir ventanas temporales, persistir dataset y evaluar el modelo base con validación fuera de tiempo; AUC objetivo del Charter: 0,75.
T-05.5: churn, 5 pts	Resolver credencial y negociar alcance antes de comprometer. Mora y churn completos suman 18 pts frente a una referencia de 15 a 16.
M2 y M4	M2 conserva el pendiente de churn. Patrocinador y equipo revisarán prioridad y fecha de M4.

Decisiones solicitadas. Confirmar el foco de mora, asignar responsable y fecha para el acceso a churn y registrar la aceptación durante la Review. El tablero de C1 se conserva como antecedente; docs/SPRINT_BACKLOG.md registra el estado de C2.

Fuentes: consigna C2; Charter y propuesta C1; bitácora del caso; código, PR y CI. README contiene la matriz requisito-solución-evidencia. Registro del evento: docs/SPRINT_REVIEW_ACCEPTANCE.md. Verificación: github.com/OscarSantiagoMerino/DataForge-Consulting.
