Reporte de Sprints y métricas ágiles

Programa de Analítica Predictiva: Sprints 1 y 2 con Scrum y XP

Cliente: FinBank S.A., Vicepresidencia de Riesgos y Analítica Código: GMAC-FB-2026-01
Daniel Felipe Martínez Hernández · Rafael Alejandro Baracaldo Doikov · Oscar Santiago Merino Suárez

1. Alcance del reporte

En C1 gestionamos el caso con PMBOK y un tablero Kanban. En C2 retomamos los mismos dos sprints, el backlog y el bloqueo de acceso, dentro de las 12 semanas y COP $180.000.000 del Charter. Scrum aporta objetivos, eventos y medición de capacidad; XP incorpora parejas, pruebas y revisión del código. Rafael Baracaldo actúa como Product Owner, Oscar Merino como Scrum Master y los tres como Developers. Daniel Martínez conserva el reporte formal al patrocinador. Las fechas y actas de gestión describen el **escenario académico**; los commits, PR y ejecuciones de octubre sustentan la evidencia técnica. Actualización: 16 de octubre de 2026.

2. Cierre de los sprints

Sprint	Fechas del caso	Objetivo	Compromiso	Cierre	Resultado
S1	10–21 ago.	Establecer gobierno, acceso y perfilamiento.	16	16	Cumplido
S2	24 ago.–4 sep.	Preparar la base de datos de mora y churn.	20	15	Parcial

Backlog del Sprint 1


ID	Ítem	Pts	Estado
US-01	Charter aprobado en el caso	3	Hecho
US-02	Acuerdo y condiciones de acceso	5	Hecho
US-03	Perfilamiento de la muestra	5	Hecho
US-04	Tablero, repositorio y DoD	3	Hecho


Backlog del Sprint 2


ID	Ítem	Pts	Estado
T-05.0	Muestra sintética y layout de mora	2	Hecho
T-05.6	Reglas de validación y pruebas	3	Hecho
T-05.1	Reporte de calidad	4	Hecho
T-05.4	Etiquetas de mora a 30 y 60 días	3	Hecho
T-05.2	Diccionario v1: 18 variables	3	Hecho
T-05.5	Extracto histórico de churn	5	Bloqueado

El incremento técnico está integrado en `main` por el PR #8: genera 5.000 registros sintéticos, valida la entrada y calcula completitud, diccionario y etiquetas. Excluye cuatro de 22 variables con completitud inferior al 80 %; conserva 18 y pasa 16 pruebas. Las tasas de mora son 5,85 % a 30 días y 2,37 % a 60 sobre 4.681 observados; 319 etiquetas conservan NaN. M2 mantiene pendiente churn. El registro de aceptación del incremento se completará durante la Review.

3. Velocidad y burndown

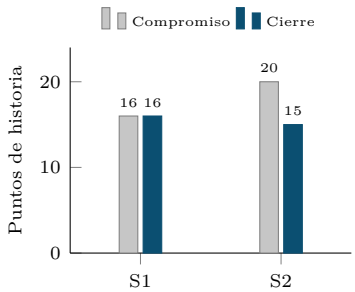

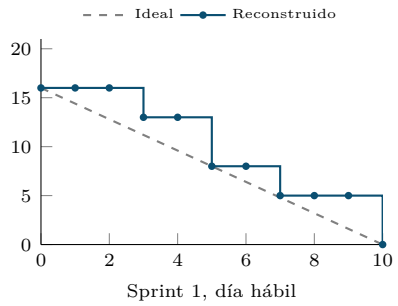

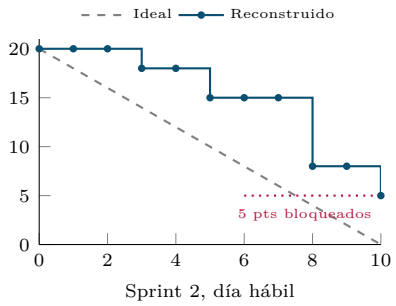

Curvas reconstruidas con los cierres diarios del caso. Fuente: `docs/SPRINT_METRICS.md` y `docs/evidence/sprint_burndown.csv`. R-01 y T-05.3 están incluidos en las historias, sin puntos adicionales.

Sprint	Compromiso	Cierre	Cumplimiento	Lectura
S1	16	16	100 %	US-04 cierra en D3; US-03 en D5; US-01 en D7 y US-02 en D10.
S2	20	15	75 %	Descuenta 2 puntos en D3, 3 en D5, 7 en D8 y 3 en D10; churn conserva 5.
Velocidad media		15,5		Referencia inicial para el siguiente Planning.

El compromiso creció 25 % entre S1 y S2. Los 15 puntos cerrados dejan una referencia de capacidad de 15 a 16 por sprint. T-05.5 depende de una credencial externa; PO y Developers deberán comprobar esa dependencia antes de comprometerla. Las curvas concilian la bitácora con los puntos de cada ítem.

4. Bitácora de Daily Scrum

Daily previsto de quince minutos. La selección recoge los días en que cambió el plan del caso. Los registros originales de reuniones se acreditarán según el alcance del simulacro admitido por el docente.

Día	Hecho desde el último Daily	Plan del día	Impedimento o decisión
S1 D1	Planning: cuatro ítems, 16 puntos.	Daniel prepara Charter; Oscar el tablero; Rafael pide la muestra.	Solicitar acceso y muestra de apoyo.
S1 D3	Tablero y DoD disponibles (US-04); muestra recibida.	Perfilar la base y tramitar el acuerdo.	Acceso a bodega pendiente (R1).
S1 D5	Perfilamiento cerrado (US-03).	Revisar Charter con patrocinador.	Centralizar el script de perfilamiento.
S1 D7	Charter aprobado en el caso (US-01).	Atender observaciones de protección de datos.	Acuerdo pendiente de firma en el caso.
S1 D10	Acuerdo cerrado en el caso (US-02); 16 puntos.	Review, retro y Planning S2.	Adoptar repositorio y CI.
S2 D1	Planning: seis ítems, 20 puntos.	Preparar mora y solicitar acceso a churn.	Dependencia externa abierta.
S2 D3	Muestra y layout listos (T-05.0).	P1: Rafael conduce y Daniel revisa reglas y pruebas.	Revisar faltantes y columnas personales.
S2 D5	Reglas cerradas (T-05.6); siete pruebas de la etapa pasan.	Reporte de calidad y refactor R-01.	Límites duplicados entre reglas y diccionario.
S2 D6	Calidad en revisión; refactor documentado.	Intentar extracción de churn.	Credencial pendiente; T-05.5 bloqueado.
S2 D7	Scrum Master escala; PO reordena el backlog.	P2: Oscar conduce y Rafael revisa targets 30/60.	Credencial pendiente, día 2.
S2 D8	Calidad aceptada y targets integrados en el caso.	Revisar las 18 variables del diccionario.	Churn sigue bloqueado, día 3.
S2 D10	Diccionario cerrado en el caso; 15 puntos.	Review y retrospectiva.	T-05.5 vuelve al Product Backlog.

5. Actas de retrospectiva

	Empezar (Start)	Dejar de hacer (Stop)	Continuar (Continue)
S1	Centralizar scripts en el repo y ejecutar CI. Probar reglas antes del análisis y trabajar en parejas.	Mantener trabajo aislado en equipos personales. Aceptar resultados sin ejecución compartida.	Pedir una muestra de apoyo mientras se tramita acceso; permitió avanzar con R1 abierto.
S2	Planear según capacidad. Verificar dependencias con una Definition of Ready y escalar bloqueos el mismo día.	Comprometer tareas atadas al calendario de otra área. Duplicar límites entre código y diccionario.	Rotar conductor y navegador. Mantener pruebas y revisión de cambios. Reordenar con el PO.

Origen	Acción de mejora	Responsable	Estado
S1	Repositorio, CI y DoD con pruebas y revisión por PR.	Oscar	Operativos
S1	Registrar dos sesiones de parejas con rotación.	Rafael	P1/P2 en XP_LOG
S2	Usar 15–16 puntos como referencia de capacidad.	Rafael	Propuesta S3
S2	Verificar dependencias antes del compromiso (DoR).	Oscar	Para Planning S3
S2	Escalar impedimentos en 24 horas.	Oscar	Seguimiento en S3

6. Prácticas XP

Práctica	Aplicación	Evidencia en el repositorio
Programación en parejas	P1: Rafael/Daniel en reglas; P2: Oscar/Rafael en targets. Cambio de conductor documentado.	Coautoría en `211d6c3` y `b3bb92e`; `docs/XP_LOG.md`, práctica 01.
Pruebas y TDD	La ausencia de `loan_amount` expone un fallo. El refactor detecta esa columna.	`c90a325`: 1 falla, 11 pasan; `d9d2b52`: 12 pasan. Suite completa: 16; registros en `docs/evidence/tdd/`.
CI y propiedad colectiva	PR #1 a #8 aprobados e integrados; #8 consolida los componentes en `main`.	CI exitoso en `0b53f59`; rama protegida. XP_LOG distingue aportes y aprobaciones.
Diseño simple y refactor	Validación y diccionario consultan `schema.py`. Pasa de 99 líneas y cinco variables a 84 y 22.	Antes en `docs/refactoring/`; después en `src/finbank/validation.py`; pruebas del refactor conservadas.

Repositorio: `https://github.com/OscarSantiagoMerino/DataForge-Consulting`

7. Diferencias de trabajo entre C1 y C2

El Charter mantiene alcance, presupuesto y gobierno. Scrum organiza el compromiso por sprint y XP aporta controles técnicos que se ejecutan junto con el código.

	C1: PMBOK y Kanban	C2: Scrum y XP
Unidad de trabajo	Tarjeta que entra según el límite de trabajo en curso (WIP).	Sprint con objetivo, backlog priorizado y compromiso de puntos.
Roles	Líder, analista y facilitador; matriz RACI y responsable por tarjeta.	Product Owner, Scrum Master y Developers; colaboración sobre el código.
Métricas	Throughput, tiempo de ciclo, WIP y variaciones de costo y plazo.	Velocidad estimada frente al cierre y burndown diario.
Uso de las métricas	Ubicar esperas y controlar la línea base del proyecto.	Estimar capacidad y ajustar el compromiso del próximo sprint.
Impedimentos	Tarjeta bloqueada y escalamiento mediante control de cambios.	Daily detecta el bloqueo; SM escala y PO reordena el backlog.
Cierre del trabajo	Resultado reproducible, documentado y validado por negocio.	Añade pruebas en CI y revisión por pares; aceptación del incremento en Review.
Control de calidad	Revisión de negocio en la columna de validación.	Parejas, pruebas y revisión técnica durante la implementación.
Mejora	Decisiones del patrocinador en el hito de control.	Retrospectivas con responsables y seguimiento, dentro del gobierno del Charter.
Review con cliente	Presentación de avance, riesgos y tablero.	Demo del incremento y registro de aceptación y observaciones.

La simulación permitió contrastar el compromiso de 20 puntos con los 16 de S1. Las pruebas y revisiones aportan evidencia del cierre técnico de 15 puntos. Las retrospectivas asignan responsables a las mejoras. PMBOK conserva el control del presupuesto y de los cambios de alcance.

8. Pronóstico para Sprint 3

La propuesta prioriza US-06, modelo base de mora (13 puntos), con ventanas temporales, dataset persistido y validación fuera de tiempo; el Charter fija AUC objetivo de 0,75. Churn (cinco puntos) requiere resolver acceso y negociar alcance: ambos ítems completos suman 18 frente a la referencia de 15–16. El traslado propuesto de US-07 a S4 exige revisar M4 con el patrocinador. En la Review se confirmará esta prioridad y se completará `docs/SPRINT_REVIEW_ACCEPTANCE.md`. El guion prevé 900 segundos, con 150 de demo y 60 de preguntas. README vincula cada requisito con su solución y evidencia; la preparación actualizada está en la PR #9, pendiente de aprobación por otro integrante.
